

(社会資本総合整備計画(都市公園) 事後評価書

平成28年6月 日

計画の名称	塩尻市安全・安心な都市公園の整備			
計画の期間	平成24年度～平成25年度(2年間)	交付対象	塩尻市	
計画の目標				

塩尻市の都市公園は開設次期が古い公園施設が多く、公園施設の老朽化が進み、都市公園長寿命化を策定し、公園施設の改築・更新を図り、費用の平準化を図る。
劣化が激しく更新が必要な遊具を「塩尻市安全・安心対策緊急総合支援事業計画」により整備の促進を図る。
都市公園長寿命化の結果により必要な整備の促進を図る。

計画の成果目標(定量的指標)

- ・30箇所の公園のうち、改築・更新の必要な26箇所の都市公園を平成24年度・25年度に長寿命化計画の策定を行う。
- ・平成25年度に公園施設(遊具)の更新整備を図る。

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H 末)	最終目標値 (H25末)
------------------	----------------	-----------------

備考

長寿命化計画済みの割合(%)
=長寿命化計画策定済みの公園数/長寿命化計画策定が必要な公園数
長寿命化対策済みの割合(%)
=改築・更新済みの公園数/改築・更新の必要な公園数

0%		100.0%	26公園 (H24:15公園, H25:11公園)
0%		25.0%	32公園 (H24:6公園, H25:8公園)

全体事業費	合計 (A+B+C)	37 百万円	A	37 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	0%
-------	---------------	-----------	---	-----------	---	----------	---	----------	-------------------------	----

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
塩尻市建設事業部都市計画課内において実施。	交付期間終了後 公表の方法 ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
1-A-1	公園	一般	塩尻市	直接	塩尻市			都市公園長寿命化計画策定	市内の都市公園26箇所の長寿命化計画策定	塩尻市						8.41	
1-A-2	公園	一般	塩尻市	直接	塩尻市			塩尻市安全・安心対策緊急総合支援事業	小坂田公園外1公園	塩尻市						28.59	
小計(道路事業)											37						

B 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H21	H22	H23	H24	H25		
合計											0					

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
----	----------------------	----

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H21	H22	H23	H24	H25		
合計											0					

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
----	----------------------	----

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

・都市公園長寿命化計画の策定により、予算を平準化し、公園施設の改築・更新を効率的に進めることができたと考えられる。
・都市公園安全・安心緊急総合支援事業により、更新が必要な遊具の改築・更新したことにより、安心して利用できる公園となり、利用者の増加を図った。

II 定量的指標の達成状況	指標①（長寿命化計画済みの割合）	最終目標値	100%	目標値と実績値	—
		最終実績値	100%		—
	指標②（長寿命化対策済みの割合）	最終目標値	25%	目標値と実績値	—
		最終実績値	25%		—

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)


—

3. 特記事項（今後の方針等）

今後は、塩尻市公園施設長寿命化対策に基づき施設の維持、修繕、更新を効率的に実施していく。

都市公園整備

計画の名称	塩尻市安全・安心な都市公園の整備	交付対象	塩尻市
計画の期間	平成24年度 ～ 平成25年度 (2年間)		

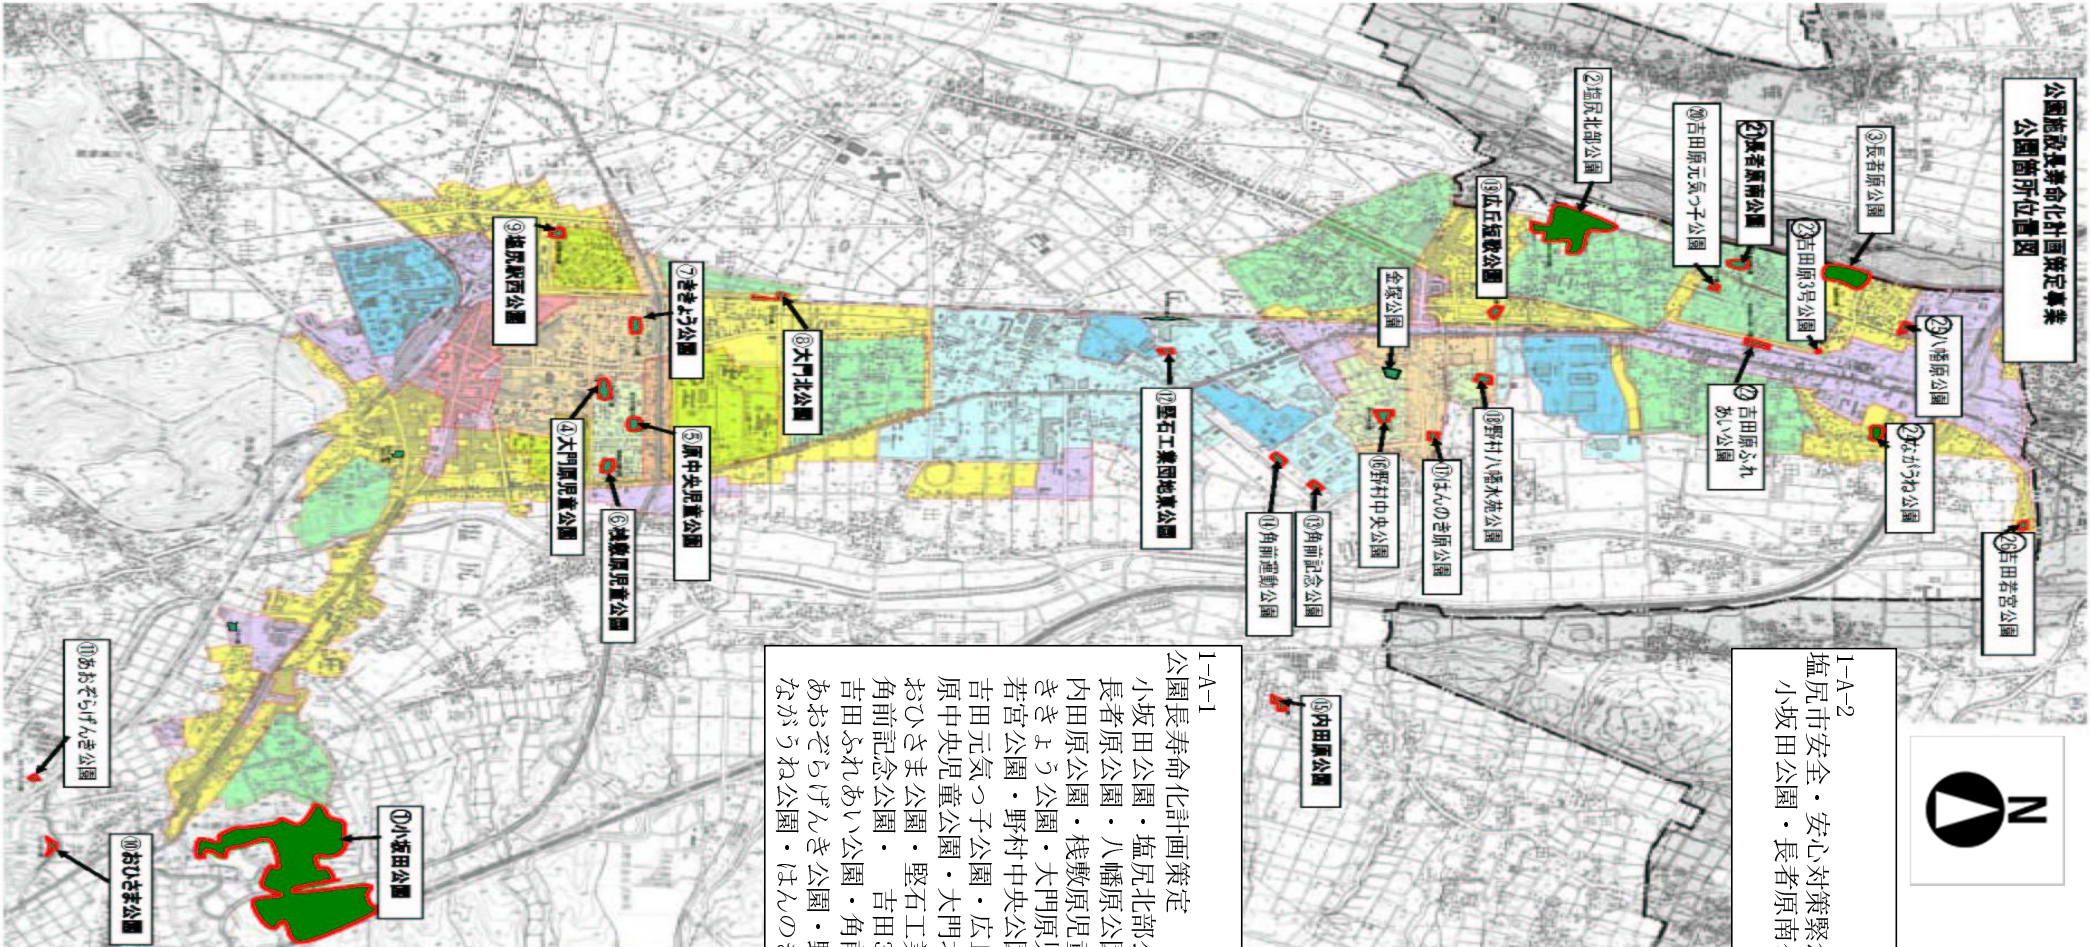

公園施設長寿命化計画策定事業
公園箇所位置図



1-A-2
塩尻市安全・安心対策緊急総合支援事業
小坂田公園・長者原南公園

1-A-1
公園長寿命化計画策定
小坂田公園・塩尻北部公園
長者原公園・八幡原公園
内田原公園・棧敷原児童公園
ききょう公園・大門原児童公園
若宮公園・野村中央公園
吉田元気つ子公園・広丘短歌公園
原中央児童公園・大門北公園
おひさま公園・聖石工業団地東公園
角前記念公園・吉田3号公園
吉田ふれあい公園・野村八幡水苑公園
あおぞらげんき公園・はんのき原公園
なががうね公園・はんのき原公園

凡例	公園名
●	1-A-1
●	1-A-2
○	1-A-3
○	1-A-4
○	1-A-5
○	1-A-6
○	1-A-7
○	1-A-8
○	1-A-9
○	1-A-10
○	1-A-11
○	1-A-12
○	1-A-13
○	1-A-14
○	1-A-15
○	1-A-16
○	1-A-17
○	1-A-18
○	1-A-19
○	1-A-20
○	1-A-21
○	1-A-22
○	1-A-23
○	1-A-24
○	1-A-25
○	1-A-26
○	1-A-27
○	1-A-28
○	1-A-29
○	1-A-30
○	1-A-31
○	1-A-32
○	1-A-33
○	1-A-34
○	1-A-35
○	1-A-36
○	1-A-37
○	1-A-38
○	1-A-39
○	1-A-40
○	1-A-41
○	1-A-42
○	1-A-43
○	1-A-44
○	1-A-45
○	1-A-46
○	1-A-47
○	1-A-48
○	1-A-49
○	1-A-50
○	1-A-51
○	1-A-52
○	1-A-53
○	1-A-54
○	1-A-55
○	1-A-56
○	1-A-57
○	1-A-58
○	1-A-59
○	1-A-60
○	1-A-61
○	1-A-62
○	1-A-63
○	1-A-64
○	1-A-65
○	1-A-66
○	1-A-67
○	1-A-68
○	1-A-69
○	1-A-70
○	1-A-71
○	1-A-72
○	1-A-73
○	1-A-74
○	1-A-75
○	1-A-76
○	1-A-77
○	1-A-78
○	1-A-79
○	1-A-80
○	1-A-81
○	1-A-82
○	1-A-83
○	1-A-84
○	1-A-85
○	1-A-86
○	1-A-87
○	1-A-88
○	1-A-89
○	1-A-90
○	1-A-91
○	1-A-92
○	1-A-93
○	1-A-94
○	1-A-95
○	1-A-96
○	1-A-97
○	1-A-98
○	1-A-99
○	1-A-100
